Grobterminprogramm Seeuferpark

Entwurf, Stand 21.11.2023

Generalplaner
SUP - Uetikon am See

Krebs und Herde Landschaftsarchitekten
Park Architekten
Takt Baumanagement
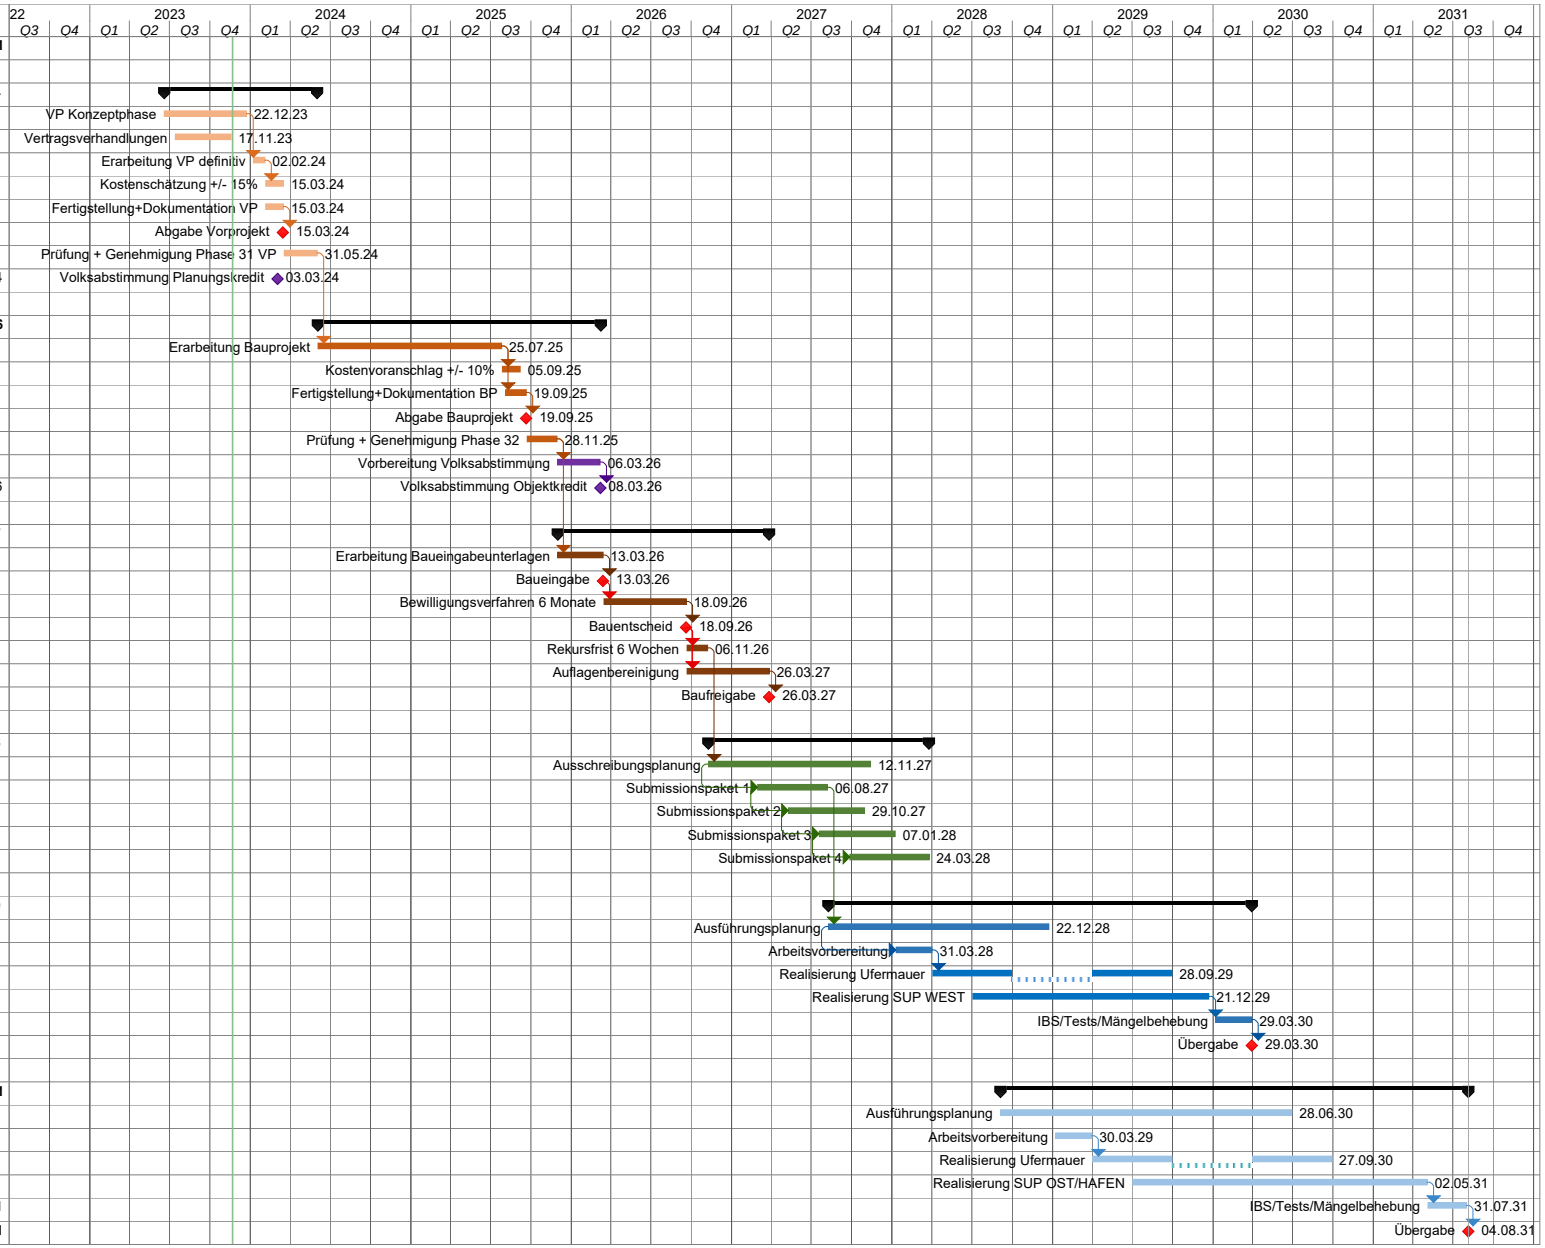
Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende
1	**SUP, Grobterminprogramm**	**Mon 19.06.23**	**Mon 04.08.31**
2			
3	**31 Vorprojektplanung**	**Mon 19.06.23**	**Fre 31.05.24**
4	VP Konzeptphase	Mon 19.06.23	Fre 22.12.23
5	Vertragsverhandlungen	Fre 14.07.23	Fre 17.11.23
6	Erarbeitung VP definitiv	Mon 08.01.24	Fre 02.02.24
7	Kostenschätzung +/- 15%	Mon 05.02.24	Fre 15.03.24
8	Fertigstellung+Dokumentation VP	Mon 05.02.24	Fre 15.03.24
9	Abgabe Vorprojekt	Fre 15.03.24	Fre 15.03.24
10	Prüfung + Genehmigung Phase 31 VP	Mon 18.03.24	Fre 31.05.24
11	Volksabstimmung Planungskredit	Son 03.03.24	Son 03.03.24
12			
13	**32 Bauprojektplanung**	**Mon 03.06.24**	**Son 08.03.26**
14	Erarbeitung Bauprojekt	Mon 03.06.24	Fre 25.07.25
15	Kostenvoranschlag +/- 10%	Mon 28.07.25	Fre 05.09.25
16	Fertigstellung+Dokumentation BP	Mon 04.08.25	Fre 19.09.25
17	Abgabe Bauprojekt	Fre 19.09.25	Fre 19.09.25
18	Prüfung + Genehmigung Phase 32	Mon 22.09.25	Fre 28.11.25
19	Vorbereitung Volksabstimmung	Mon 01.12.25	Fre 06.03.26
20	Volksabstimmung Objektkredit	Son 08.03.26	Son 08.03.26
21			
22	**33 Bewilligungsverfahren**	**Mon 01.12.25**	**Fre 26.03.27**
23	Erarbeitung Baueingabeunterlagen	Mon 01.12.25	Fre 13.03.26
24	Baueingabe	Fre 13.03.26	Fre 13.03.26
25	Bewilligungsverfahren 6 Monate	Mon 16.03.26	Fre 18.09.26
26	Bauentscheid	Fre 18.09.26	Fre 18.09.26
27	Rekursfrist 6 Wochen	Mon 21.09.26	Fre 06.11.26
28	Auflagenbereinigung	Mon 21.09.26	Fre 26.03.27
29	Baufreigabe	Fre 26.03.27	Fre 26.03.27
30			
31	**41 Submission**	**Mon 09.11.26**	**Fre 24.03.28**
32	Ausschreibungsplanung	Mon 09.11.26	Fre 12.11.27
33	Submissionspaket 1	Mon 01.03.27	Fre 06.08.27
34	Submissionspaket 2	Mon 10.05.27	Fre 29.10.27
35	Submissionspaket 3	Mon 19.07.27	Fre 07.01.28
36	Submissionspaket 4	Mon 27.09.27	Fre 24.03.28
37			
38	**5 Realisierung SUP WEST**	**Mon 09.08.27**	**Fre 29.03.30**
39	Ausführungsplanung	Mon 09.08.27	Fre 22.12.28
40	Arbeitsvorbereitung	Mon 10.01.28	Fre 31.03.28
41	Realisierung Ufermauer	Mon 03.04.28	Fre 28.09.29
42	Realisierung SUP WEST	Mon 03.07.28	Fre 21.12.29
43	IBS/Tests/Mängelbehebung	Mon 07.01.30	Fre 29.03.30
44	Übergabe	Fre 29.03.30	Fre 29.03.30
45			
46	**5 Realisierung SUP OST/HAFEN**	**Mon 04.09.28**	**Mon 04.08.31**
47	Ausführungsplanung	Mon 04.09.28	Fre 28.06.30
48	Arbeitsvorbereitung	Mon 08.01.29	Fre 30.03.29
49	Realisierung Ufermauer	Mon 02.04.29	Fre 27.09.30
50	Realisierung SUP OST/HAFEN	Mon 02.07.29	Fre 02.05.31
51	IBS/Tests/Mängelbehebung	Mon 05.05.31	Don 31.07.31
52	Übergabe	Mon 04.08.31	Mon 04.08.31
